



Rioleringswerken Genenbos



Projectzone



Werkvolgorde per fase

- * Opbraak weg + plaatsen droogzuiging als nodig
- * Riolering + huisaansluitingen + onderlaag fundering (bufferbekken Schipperstraat tussendoor)
- * Plaatsen straatkolken
- * Glijbekisting boordsteen/goot
- * Fundering weg
- * Onderlaag asfalt
- * Ophalen deksels
- * Aanwerken opritten/bermen (Fietspad Genebosstraat)

Werkvolgorde per fase

- * Aanpassingswerken nutsleidingen
- * Opbraak weg + plaatsen droogzuiging als nodig
- * Riolering + huisaansluitingen + onderlaag fundering
- * Plaatsen straatkolken
- * Glijbekisting boordsteen/goot
- * Fundering weg
- * Onderlaag asfalt
- * Aanpassingswerken nutsleidingen
- * Ophalen deksels
- * Aanwerken opritten/bermen

Rioleringswerken



Huisaansluitputjes per perceel



Minder hinder steenslag



Glijbekisting boordsteen



Glijbekisting boordsteen



Afwerken fundering



Asfalteringswerken



Fasering



Fase 1: Genebosstraat en Sint - Rochusstraat tot voor Huisveldenstraat

Fase 2: Jantestraat, Edbroekenstraat, Boskesstraat en Schipperstraat

Fase 3: Schutterstraat, Roosterstraat en Waterstraat

Fase 4: Eendrachtstraat, Bosheidestraat en Veldstraat

Fase 5: Huisveldenstraat, Nieuwstraat, Sint-Rochusstraat en Hazenbergstraat

Planning

Fase 1: Genebosstraat en Sint -
Rochusstraat tot voor
Huisveldenstraat

- * Nuts vanaf 18 nov 2019
- * Riolering vanaf 2 dec
- * Onderlaag asfalt half april
- * Beton fietspad eind april
- * Klaar begin juni 2020

Planning

Fase 2: Jantestraat, Edbroekenstraat,
Boskesstraat en Schipperstraat

- * Riolering Jantestraat vanaf mrt 2020
- * Nuts Edbroekenstraat voor Riolering
- * Onderlaag asfalt begin juli
- * Nuts Overige straten aug 2020
- * Klaar okt 2020

Planning

Fase 3: Schutterstraat, Roosterstraat en Waterstraat

- *Nuts voor riolering vanaf mrt 2020
- *Riolering vanaf juni 2020
- *Onderlaag asfalt okt 2020
- *Klaar nov 2020

Planning

Fase 4: Eendrachtstraat, Bosheidestraat en Veldstraat

- *Nuts eendrachtstraat vanaf juni 2020 voor riolering
- *Riolering vanaf sept 2020
- *Onderlaag asfalt eind nov 2020
- *Nuts overige straten jan 2021
- *Toplaag asfalt mei 2021


Planning

Fase 5: Huisveldenstraat, Nieuwstraat,
Sint-Rochusstraat en
Hazenbergstraat

- *Nuts voor riolering vanaf sept 2020
- *Riolering vanaf dec 2020
- *Onderlaag asfalt mei 2021
- *Klaar juni 2021


Omleiding

- Tijdens de volledige duur van de werken wordt een omleiding voorzien via Beringen

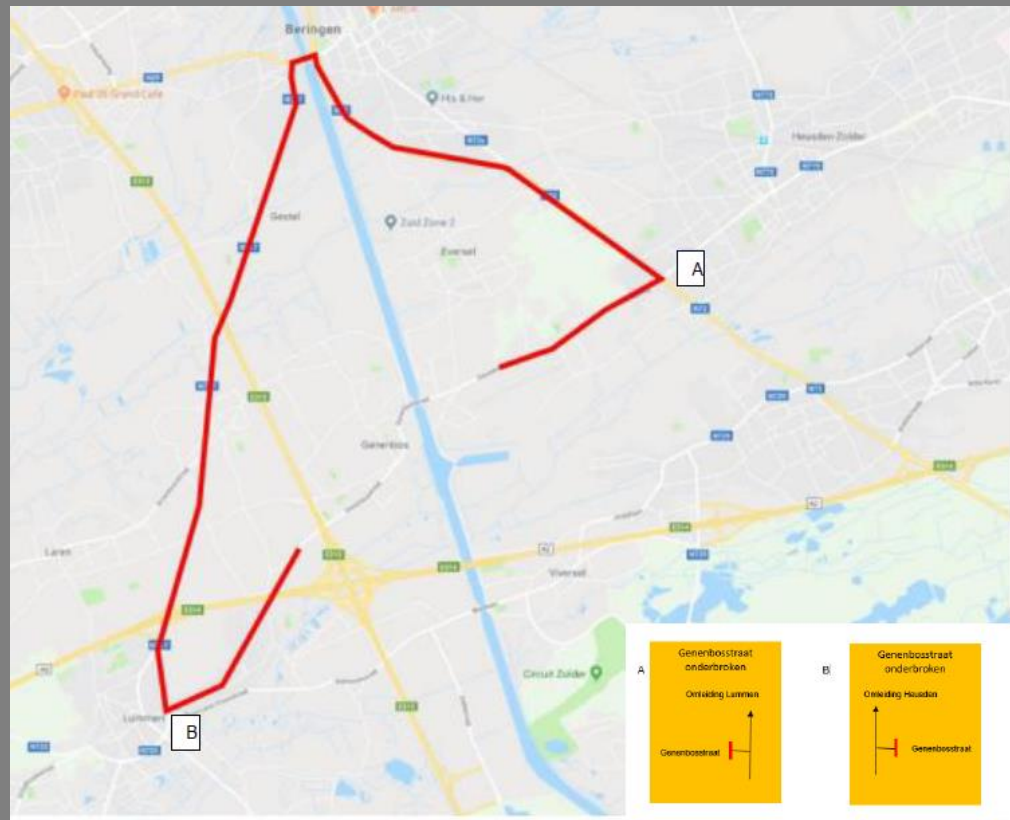


Openbaar vervoer

- Lijn 92: via O.I.Vrouwstraat, Rekhovenstraat en Eversel (bijkomende halte aan Beemdstraat en Kraaibergstraat)

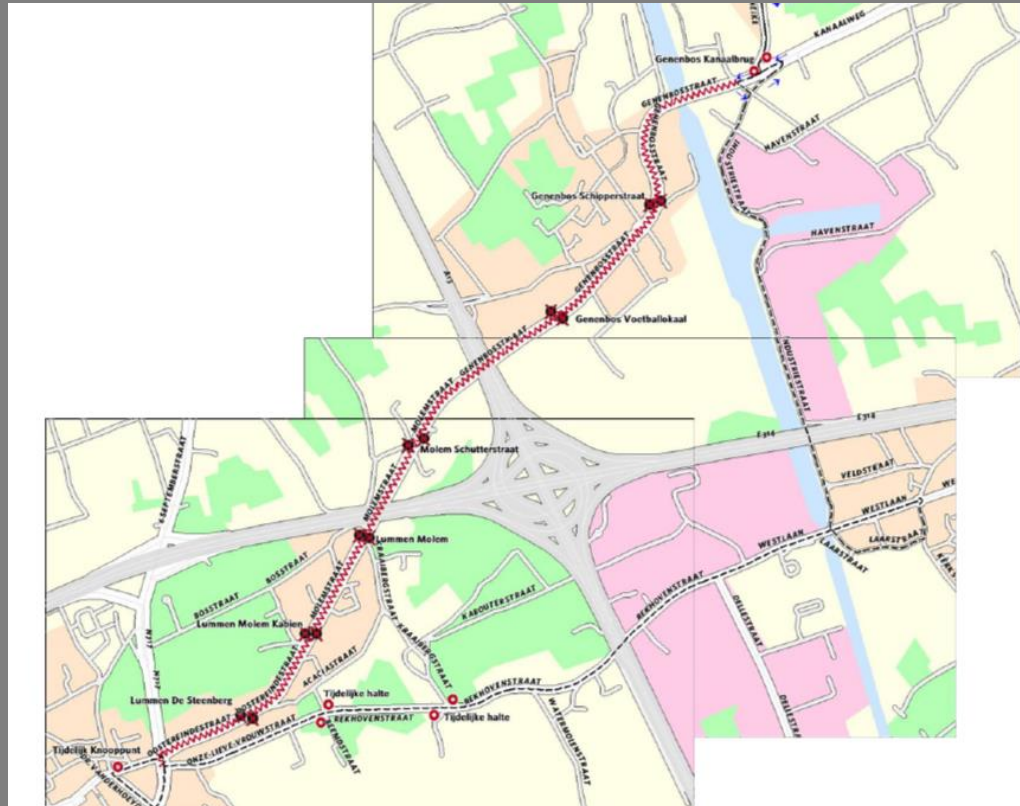

Openbaar vervoer

- Lijn 30 en 52 (School): Via Kraaibergstraat, Rekhovenstraat en Eversel

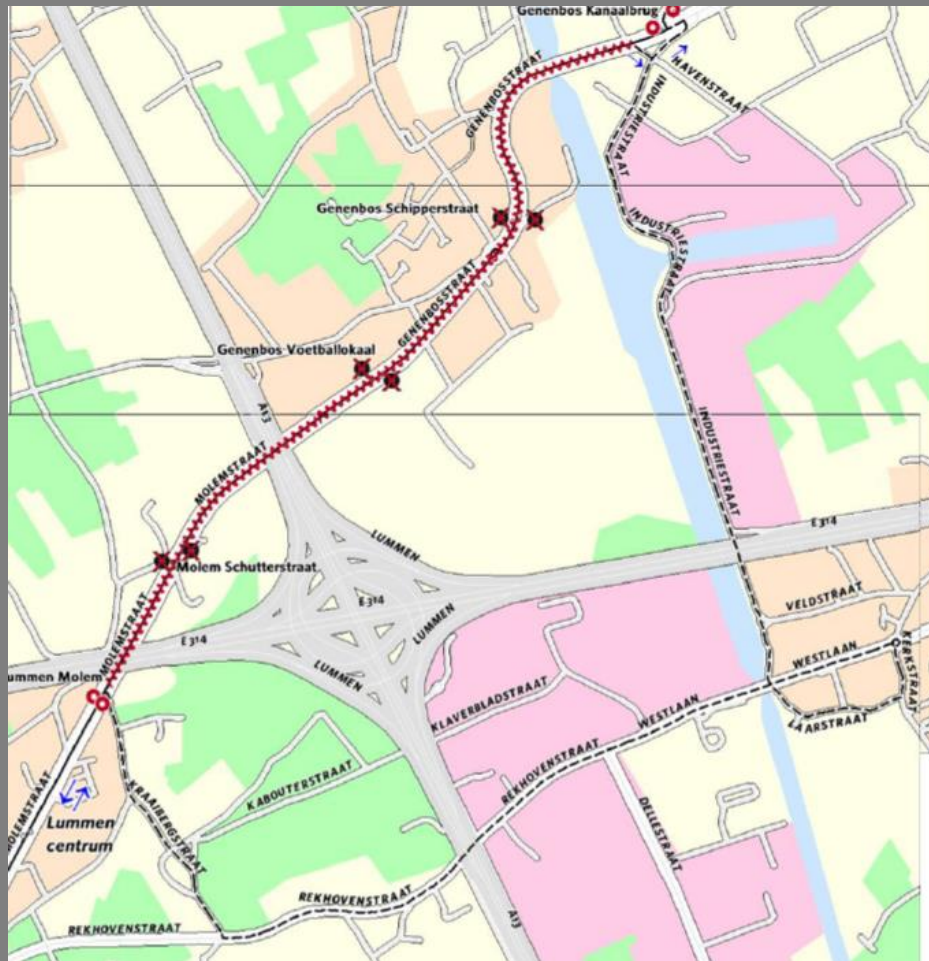

Hinder voor bewoners


- *Straten waar riolering wordt geplaatst opritten in de mate van het mogelijke toegankelijk na de werkuren
- *Tijdens periode glijbekisting/onderlaag asfalt /betonstort een 4 tal weken opritten niet toegankelijk met wagen
- *Oprit niet toegankelijk tijdens klinkerwerk voor de oprit
- *Toplaag asfalt: straat 2 dagen niet toegankelijk

Veiligheid op de werf

- De werf is geen racebaan, pas uw snelheid aan




- Pas op met werfverkeer, maak steeds oogcontact vooraleer je een machine passeert



VANGEL
W E G E N B O U W

Infobrief

- *Schets voorgevel
- *Waar zitten de bestaande aansluitingen op de riolering?
- *Waar komt gas, water, electriciteit, telefoon ... binnen?
- *Waar wenst u uw nieuwe DWA en RWA aansluiting (eventueel in overleg met afkoppelings deskundige)

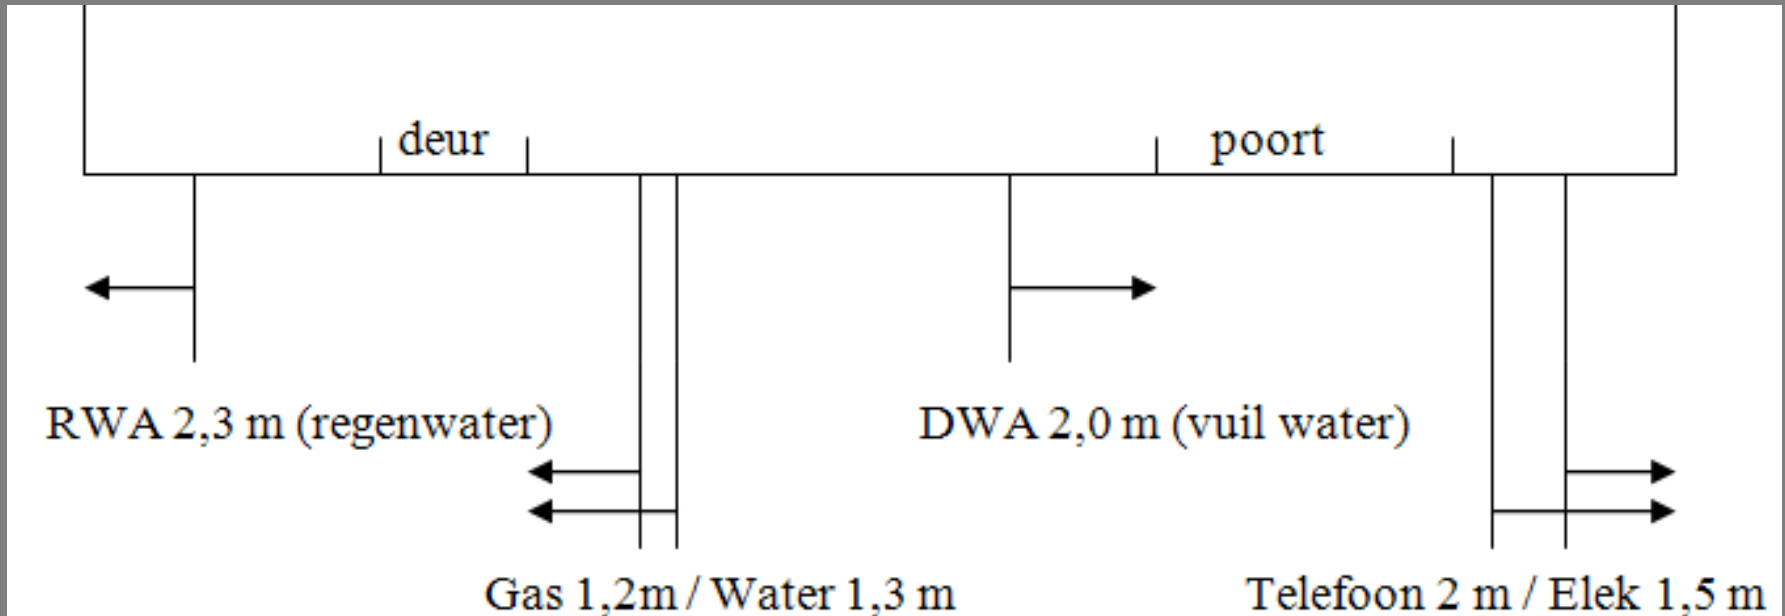

Huisvuilophaling

- *Indien zone van de werf toegankelijk
Ophaling door de afvaldiensten
- *Indien zone van de werf ontoegankelijk
Verzameling door Vangeel

- *Afvalzakken zo avond ipv ma klaar zetten
- *Papier wo avond ipv do klaar zetten
- *Glas op gewone dag (ophaling door gemeente)

Handelaars

- De handelaars binnen het tracé der werken zullen een brief krijgen van het FOD economie
- Hinderpremie 2000 EUR kan dan aangevraagd worden
- Bereikbaarheid van handelaars zal naargelang de situatie aangeduid worden via borden van UNIZO
- Afzonderlijke communicatie naar handelaars
- Gegevens in te vullen op formulier

Praktische zaken

- Projectleider Vangeel: Danny Leysen
- Wekelijkse werfvergadering in de werfkeet
- Planning zonder weerverlet of onvoorziene werken




- Bezoek afkoppelingsdeskundige is reeds gebeurd en de aannemer heeft de plannetjes
- Regelmatig bewonersbrief

Voorbeeld

Nieuwe huisaansluitputjes:

- 1 putje voor afvalwater en 1 putje voor regenwater
- Plaatsing op privé
- Maximum aansluitdiepte op 1,30 m !!
- Geen kelder aansluitingen

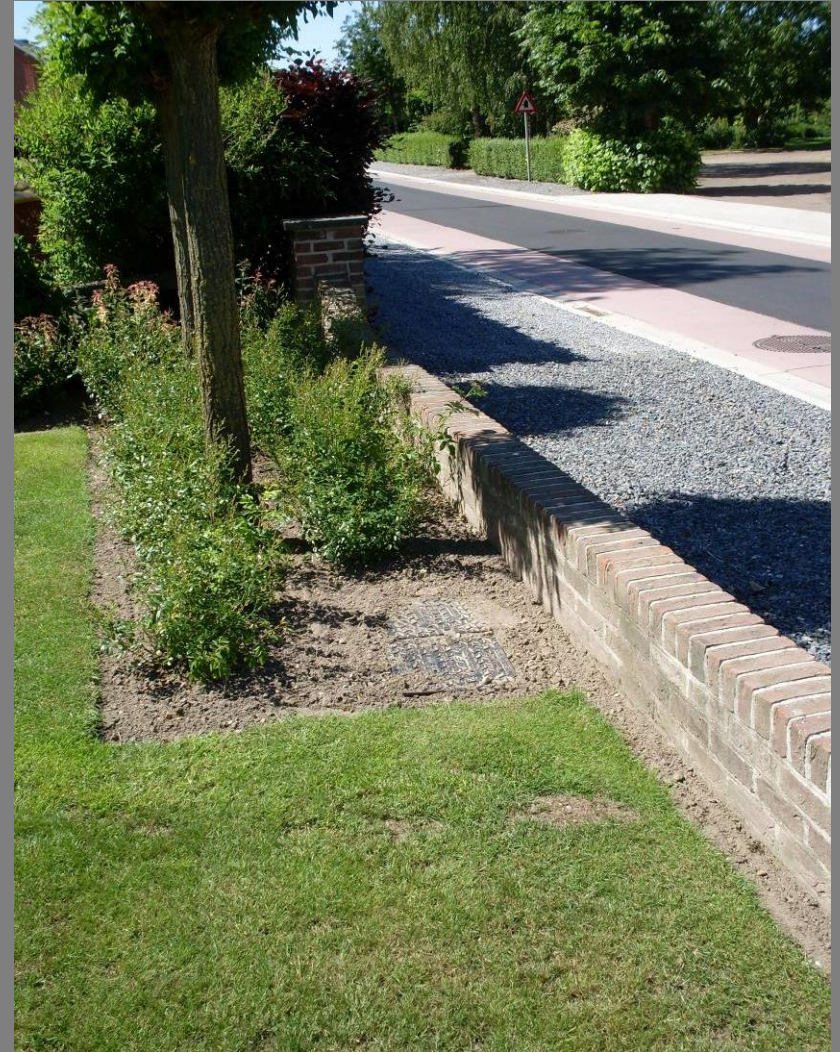

RWG-premies 2016

- Rationeel Watergebruik

- Subsidie voor privé-woningen

- Gescheiden afvoer (200€ eigen werk , max 200€ aannemer)
(enkel voor woningen vóór 01-02-2005)
 - Hemelwaterput + pomp (250€ minstens WC of wasmachine)
(enkel voor woningen vóór 07-09-1999)



- Infiltratie (250€)
(enkel voor woningen vóór 01-02-2005)

➔ Afkoppelingsdeskundige vult dit samen met u in



Procedure / aansluitplicht

- Wat indien er niet wordt afgekoppeld?
milieuovertreding (Vlarem II)!
 - Mogelijke gevolgen:
 - Vervuiling regenwaterstelsel, Wateroverlast op vuilwaterstelsel
 - Iedereen afkoppelen!
 - Recht op premie vervalt
 - Tweede keuring ten laste van eigenaar
- ➔ Vochtige doekjes = verstopt de riolen/ pompen = afval
- ➔ “Afval” hoort niet thuis in de riolering (verfresten, olie en vetten,...)
